Estimeret Tidsplan for altanmontage
Bellahøjvej 142
Sags nr. 18403
Rev. 23/11-22

Id	ADRESSE	Antal arbejdsdage	Startdato	Slutdato
1	**Team 21 Karre 1 Matr. 2715**	0 dage	on 31-03-21	on 31-03-21
2	Opstart af Byggeplads	3 dage	on 07-09-22	fr 09-09-22
3	Ranke 11 Sandbygårdsvej 31	5 dage	ma 12-09-22	fr 16-09-22
4	Ranke 105 Aggervoldsvej 6	5 dage	ma 19-09-22	fr 23-09-22
5	Ranke 103 Aggervoldsvej 6	5 dage	ma 26-09-22	fr 30-09-22
6	Ranke 102 Aggervoldsvej 4B	5 dage	ma 03-10-22	fr 07-10-22
7	Ranke 98 Aggervoldsvej 4A	8 dage	ma 10-10-22	on 19-10-22
8	Ranke 84 Bellahøjvej 140	4 dage	ti 01-11-22	fr 04-11-22
9	Ranke 57 og 58 Bellahøjvej 130	15 dage	ma 07-11-22	fr 25-11-22
10	Ranke 69 og 70 Bellahøjvej 134	8 dage	ma 28-11-22	on 07-12-22
11	Ranke 48 Annebergvej nr. 1	5 dage	to 08-12-22	on 14-12-22
12	Ranke 37 Annebergvej 7	4 dage	to 15-12-22	ti 20-12-22
13	Færdiggørelse af evt. mangler i karre 1	3 dage	on 21-12-22	fr 23-12-22
14				
15	**Team 8 Karre 3 Matr. 2575**	0 dage	on 31-03-21	on 31-03-21
16	Opstart byggeplads karre 3	12 dage	on 21-09-22	to 06-10-22
17	Færdiggørelse af Ranke 74 Sandbygårdsvej 12	3 dage	fr 07-10-22	ti 11-10-22
18	Ranke 71 Sandbygårdsvej 12	5 dage	to 27-10-22	on 02-11-22
19	Ranke 64 Sandbygårdsvej 8	4 dage	to 03-11-22	ti 08-11-22
20	Ranke 54 Sandbygårdsvej 2	11 dage	on 09-11-22	on 23-11-22
21	Ranke 50 Næsbyholmvej 11	5 dage	to 24-11-22	on 30-11-22
22	Ranke 37 Torbenfeldt vej 1	5 dage	to 01-12-22	on 07-12-22
23	Ranke 95 Annebergvej 10	5 dage	to 08-12-22	on 14-12-22
24	Færdiggørelse af evt. mangler i karre 3	2 dage	to 15-12-22	fr 16-12-22
25		0 dage	ti 30-03-21	ti 30-03-21
26	**Team 8 Karre 2 Matr. 2709**	0 dage	on 31-03-21	on 31-03-21
27	Opstart byggeplads i karre 2	2 dage	ma 19-12-22	ti 20-12-22
28	Ranke 18 Torbenfeldtvej 23 Ranke 20 Torbenfeldtvej 23	9 dage	on 21-12-22	ti 10-01-23
29	Ranke 47 Sandbygårdvej 24 Ekstra Team	5 dage	on 14-12-22	ti 20-12-22
30	Ranke 63 Sandbygårdvej 30 Ekstra Team	4 dage	ti 20-12-22	fr 23-12-22
31	Ranke 2 Torbenfeldtvej 31	4 dage	on 11-01-23	ma 16-01-23
32	Ranke 81 Aggersvoldvej 14	4 dage	ti 17-01-23	fr 20-01-23
33	Færdiggørelse af evt. mangler i karre 2	2 dage	ma 23-01-23	ti 24-01-23

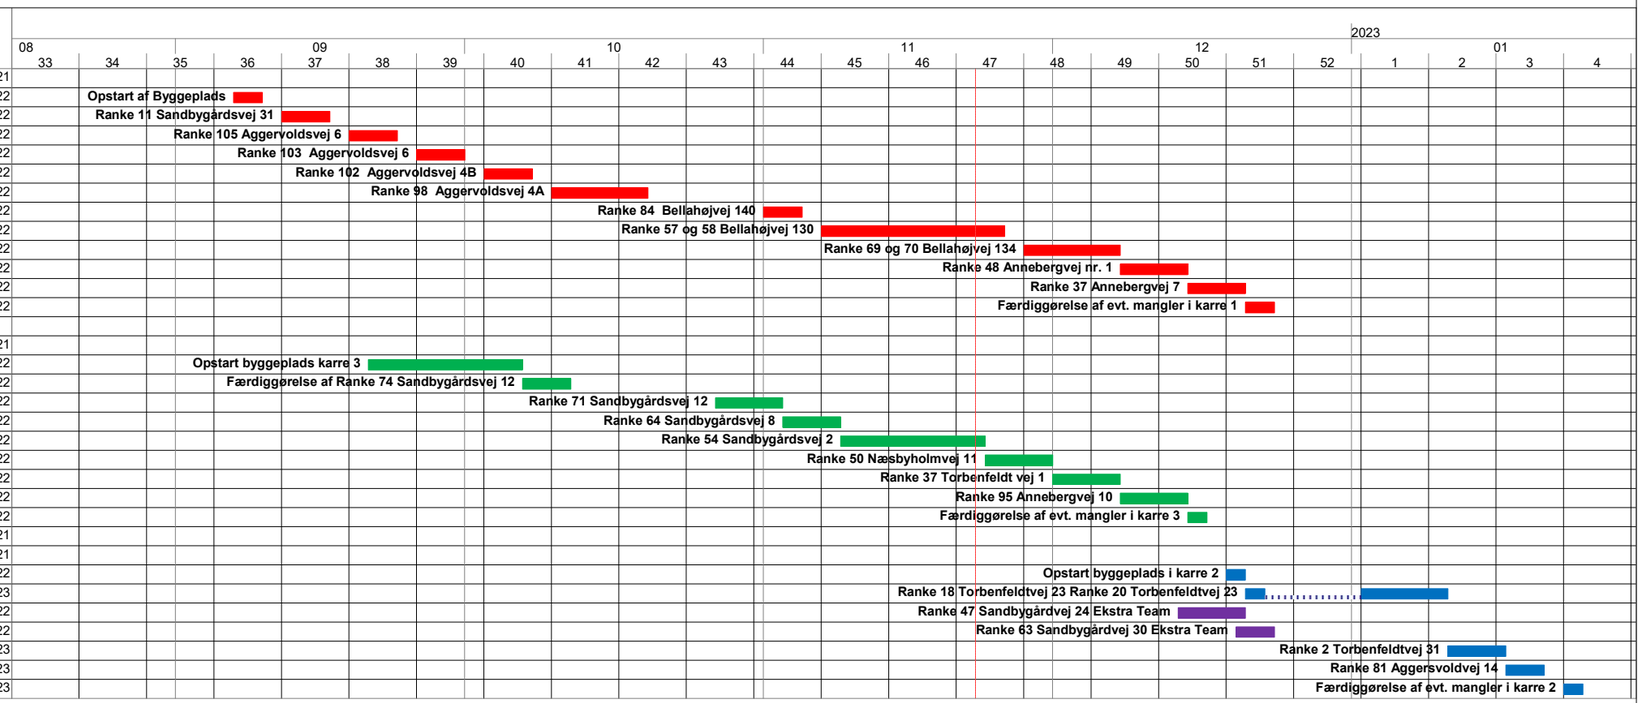

Dato: on 23-11-22

Byggeperiode | Milepæl | Inaktiv opgave | Inaktiv oversigt | Kun varighed | Manuel oversigt | Kun slutdato
Opdeling | Oversigt | Inaktiv milepæl | Manuel opgave | Manuel oversigtsopløftning | kun start | Fremdrift

Estimeret tidsplan - Forbehold for ændringer, vejrlig, ekstraarbejde.
